

## ACTA ENTREGA RECEPCION DE OBRA DEL CONVENIO N.º 199-CGOP-2021

**OBJETO: MANTENIMIENTO DE 4 RAMALES EN LA COMUNIDAD MORAN VALVERDE 1 DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA.**

En la ciudad de El Coca, a los 26 días del mes de julio de 2022, se suscribe la presente acta recepción de obra de convenio, al tenor de las siguientes estipulaciones:

### PRIMERA: COMPARECIENTES.-

El Coordinador General de Obras Públicas Ing. Edison Morales, debidamente autorizado por la Ing. Magali Orellana – Prefecta Provincial de Orellana, notifica a una comisión de recepción, para la celebración de la presente acta entrega recepción única, por una parte la comisión de recepción representada por:

Ing. Julio Sarmiento

Delegado de la Sección de Vialidad de la  
Coordinación General de Obras Públicas

Sr. Wilson Guerrero

Presidente de la Parroquia San Carlos

Con el fin de dar cumplimiento a lo que señala la Ley, se constituyen con el objeto de verificar los trabajos ejecutados y proceder a realizar la recepción única de la obra, haciendo para el efecto constatar lo siguiente:

### SEGUNDA: ANTECEDENTES.-

Mediante Convenio de Cooperación entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Orellana ejecuta la obra en la comunidad Moran Valverde de la Parroquia San Carlos.

Objeto:

**MANTENIMIENTO DE 4 RAMALES EN LA COMUNIDAD MORAN VALVERDE 1 DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA.**

Monto USD\$:

14,186.86

Plazo:

11 días

### TERCERA: INSPECCIÓN DE OBRA.-

La Comisión Técnica conformada por los comparecientes, con fecha 26 de julio de 2022 nos constituimos en el sitio de la obra: **MANTENIMIENTO DE 4 RAMALES EN LA COMUNIDAD MORAN VALVERDE 1 DE LA PARROQUIA SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA** y procedimos a verificar físicamente que los trabajos realizados se han cumplido según INFORME TÉCNICO N° 026-NC-JV-OO.PP-GADPO-2022, presentado por el Tnlgo. Neycer Caicedo SUPERVISOR DE OBRAS PÚBLICAS.

**TRABAJOS REALIZADOS.-**

Mantenimiento de 5,110 metros de vía

**CUARTA: LIQUIDACIÓN ECONÓMICA DE LA OBRA.-**

Aporte del G.A.D.P.O

**MANTENIMIENTO DE 4 RAMALES EN LA COMUNIDAD MORAN VALVERDE 1 DE LA PARROQUIA  
SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA**

**DESGLOSE DE GASTOS**

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
<b>Motoniveladora</b>					
Sueldo promedio operador.....	Diario	1	5	39.68	198.40
Sueldo promedio ayudante	Diario	1	5	29.17	145.85
Combustible (diésel)	Galón	139.5	5	2.10	292.95
<b>Rodillo</b>					
Sueldo promedio operador.....	Diario	1	6	39.68	238.08
Combustible (diésel)	Galón	118	6	2.10	247.80
<b>Tanquero de agua</b>					
Sueldo promedio (chófer tipo E)	Diario	1	5	34.11	170.55
Combustible (diésel)	Galón	55	5	2.10	115.50
Combustible (gasolina)	Galón	2.5	5	2.25	5.63
<b>Tractor</b>					
Sueldo promedio operador.....	Diario	1	5	32.33	161.65
Combustible (diésel)	Galón	175	5	2.10	367.50
<b>Tanquero de Combustible</b>					
Sueldo promedio (chófer tipo E)	Diario	1	2	34.11	68.22
Combustible (diésel)	Galón	26	2	2.10	54.60
<b>Volquete</b>					
Sueldo promedio (chófer tipo E)	Diario	3	11	34.11	375.21
Combustible (diésel)	Galón	303	11	2.10	636.30
<b>Subtotal=</b>					<b>3078.24</b>

## COSTO DE MANTENIMIENTO

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	DIAS	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
Motoniveladora	Diario	1	5	20.00	100.00
Rodillo	Diario	1	5	20.00	100.00
Tanquero de agua	Diario	1	5	15.00	75.00
Tractor	Diario	1	6	20.00	120.00
Tanquero de Combustible	Diario	1	2	15.00	30.00
Volquete	Diario	3	11	15.00	165.00
					<b>590.00</b>
<b>COSTO TOTAL=</b>					<b>3668.24</b>

**TOTAL PROYECTO:** USD 3,668.24 (TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 24/100 CTVS DE DÓLAR AMERICANO).

### QUINTA: OBSERVACIONES.-

#### MAQUINARIA PARA EL TRASPASO DE DIAS

EQUIPO	PLAZO DÍAS CONVENIO	EQUIPO QUE SE REQUIERE	DIAS REQUERIDOS
MOTONIVELADORA	11	TRACTOR	06

Para la ejecución de la obra por administración se utilizo lo siguiente:

MAQUINARIA UTILIZADA	MAQUINARIA NO UTILIZADA
Motoniveladora # 05	Cama baja
Tractor # 10	
Rodillo # 06	
Tanquero de agua # 06	
Volquetes # 31; 36 y 35 ( Los tres volquetes suman un total de 11 días laborados)	
Tanquero de combustible # 02	

### SEXTA: LIQUIDACIÓN DE PLAZOS.



Fecha de suscripción del convenio	17 de noviembre de 2021
Plazo estipulado	11 días
Fecha de Inicio trabajos	01 de junio de 2022
Fecha de término del trabajo	15 de junio de 2022
Días utilizados	06 días

SÉPTIMA: ANEXO FOTOGRÁFICO.-

# GADPO

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  
DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

MANTENIMIENTO DE 4 RAMALES EN LA COMUNIDAD MORAN VALVERDE 1 DE LA PARROQUIA  
SAN CARLOS DEL CANTON JOYA DE LOS SACHAS-PROVINCIA DE ORELLANA

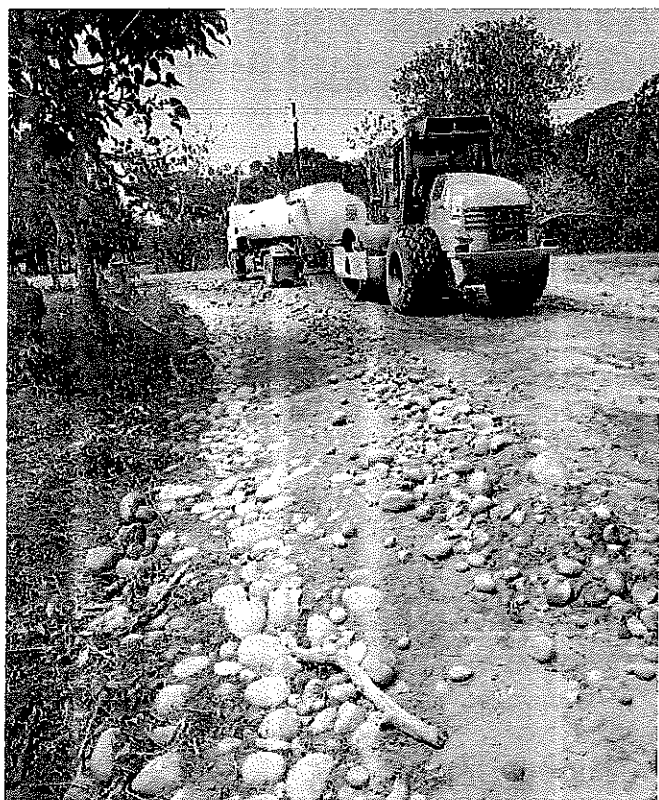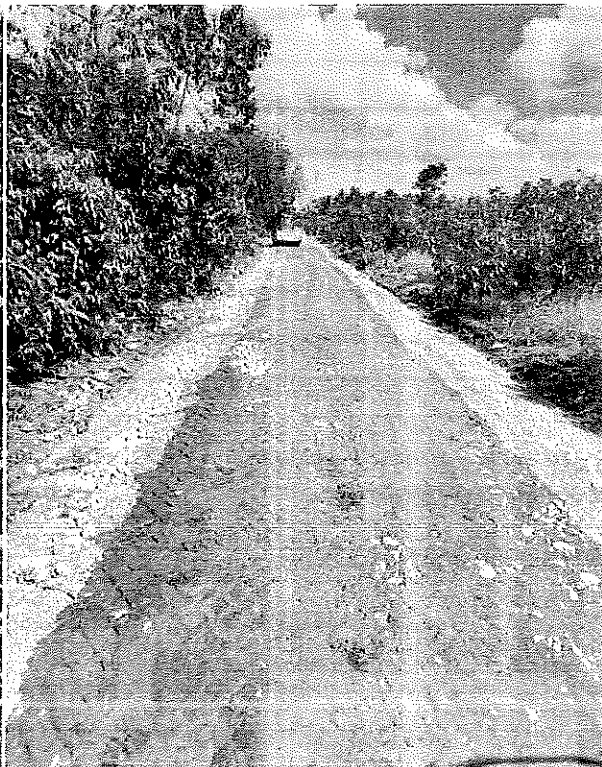

☎ 063 731 760 / 063 731 761

📍 Av. 9 de Octubre entre Dayuma y César Andy

✉ [prefectura@gporellana.gob.ec](mailto:prefectura@gporellana.gob.ec)


🌐 [gporellana.gob.ec](http://gporellana.gob.ec)

**OCTAVA: ACEPTACIÓN.-**


La Comunidad y Comisión de Recepción está aceptando los trabajos realizados y detallados en la presente acta.

Por los antecedentes expuestos, dejamos expresa constancia de la Recepción de la Obra, según lo dispuesto en el Reglamento de la Ley del Sistema Nacional Contratación Pública y Código Civil vigente.


Para constancia y plena aceptación de lo anteriormente estipulado, las partes firman en unidad del acto la presente Acta Entrega Recepción Única, en un original y dos copias del mismo tenor y valor, en el lugar y fecha antes mencionado.




Ing. Julio Sarmiento  
**JEFE DE VIALIDAD Y TRANSPORTE**



Sr. Wilson Guerrero  
**PRESIDENTE DE LA PARROQUIA SAN CARLOS**



Ing. Neycer Caicedo  
**SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS**



Ing. Edison Morales  
**COORDINADOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS ENCARGADO**
